

---

**Bauherrschaft**

---

Kanton Glarus  
Departement Bau und Umwelt




---

**Auftragsbezeichnung**

---

Ausbau Netstalerstrasse

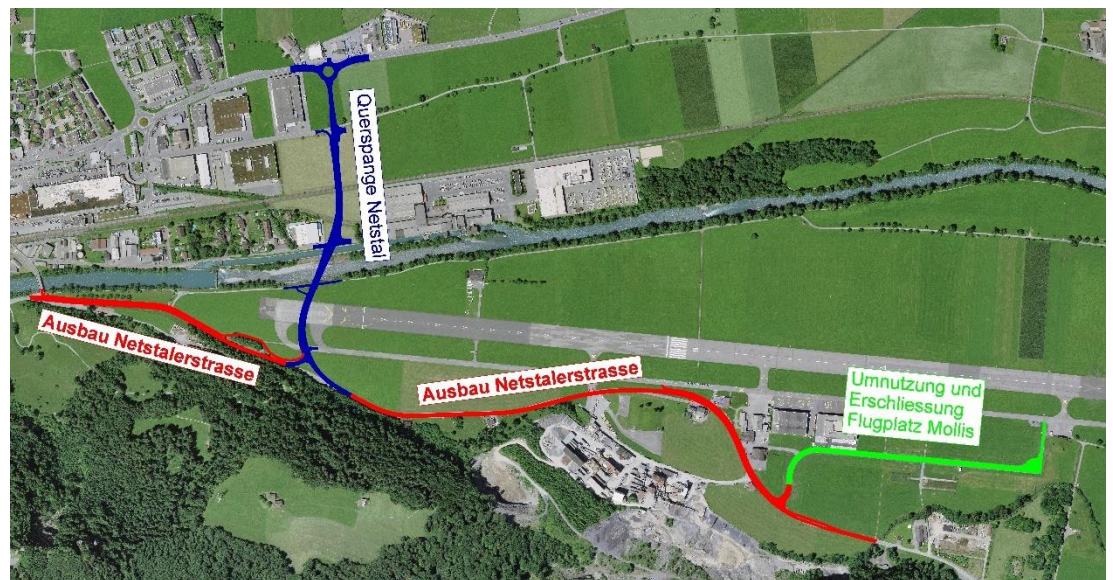

---

MITBERICHT ZUM AUFLAGEPROJEKT

---

---

**Zusammenfassung Stellungnahmen**

---

INGE  
Marty - Geoinfra  
c/o Marty Ingenieure AG  
Ziegelbrückstrasse 58  
8866 Ziegelbrücke  
Tel. 055 617 27 17

---

<b>Auftrag Nr.</b>	1240
<b>Bericht Nr.</b>	1240-114b
<b>Datum</b>	Ziegelbrücke, 12. April 2023

---

## Stellungnahmen Bauprojekt

Definitive Fassung vom 31.3.2023

Nr.	Gegenstand	Anträge / Forderungen	Beurteilung / Massnahme	Wer	BP	AP	Bemerkungen
<b>1</b>	<b>Gemeinde Glarus Nord</b>		30.11.2022				
1.1	Gesamtprojekt	Mit Unterlagen vollumfänglich einverstanden					
<b>2</b>	<b>Gemeinde Glarus</b>		01.12.2022				
2.1	Gesamtprojekt	Keine weiteren Bemerkungen zum Projekt					
2.2	Landerwerb	Bitte um zeitnahe Bearbeitung und Zustellung des Vereinbarungsentwurfs		BHU/GPL	X		In Bearbeitung
<b>3</b>	<b>BAZL</b>		15.11.2022				
3.1	SIL Perimeter	Beurteilung als Nebenanlage > kantonales Verfahren korrekt					
3.2	Aviatische Sichtbarkeit	Beabsichtigte Trennung von IV (va. LV) zu Aviatik wird begrüsst					
3.3	HBK	Allfällige Durchstossungen HBK durch Baumaschinen vorgängig zur Bewilligung anmelden (mind. 20 Tg Vorlauf)	Berücksichtigung in Ausschreibung Sicherstellung durch Bauleitung	PV/BL		X	
3.4	Beurteilung	Keine relevanten Einwände vorhanden					
<b>4</b>	<b>Kantonspolizei, Spezialdienste</b>		19.12.2022				
4.1	Sperrung Linthbrücke	Zusätzlich zur Signalisation sind bauliche Massnahmen erforderlich	Umsetzung erfolgt im Rahmen des Projektes der Querspange. Vorgesehen sind demonierbare Pfosten.				
4.2	Temporeduktion Wildwarnung	Anpassung Standort in Übereinstimmung mit geplanter Signalisation T50 / T60 oder Verzicht auf T40 temporär	Verzicht auf T40, Signalisation Wildwechsel blinkend	PV	X		siehe 11.3
4.3	Verfügung	Alle neuen Signalisationen (temporär und definitiv) müssen durch KAPO verfügt werden. Antrag durch Projektorganisation.		BHU/GPL		X	
4.4	Grossanlässe	Gewährleistung einer zweispurigen Verkehrsführung bei Grossanlässen auf Flugplatz Mollis und an Näfelser Fahrt	Flugplatz jederzeit 2 spurig erreichbar Detailabsprache mit Flugplatz Berücksichtigung der Näfelser Fahrt bei Ausschreibung und Detaillierung Bauphasenplanung (Zweispurigkeit)	BHU/GPL PV		X	

Nr.	Gegenstand	Anträge / Forderungen	Beurteilung / Massnahme	Wer	BP	AP	Bemerkungen
<b>5</b>	<b>DBU, Wald und Naturgefahren, Naturgefahren</b>		02.12.2022				
5.1	Projektbeurteilung	Gemäss Teilverfügung wird Zustimmung zum Projekt erteilt		GPL			
<b>6</b>	<b>DBU, Wald und Naturgefahren, Wald</b>		16.11.2022				
6.1	Walddabstand	Unterschreitung ohne Auflagen genehmigt					
<b>7</b>	<b>DBK, Denkmalpflege und Ortsbildschutz</b>		06.12.2022				
7.1	Projektbeurteilung	Keine Auflagen oder Anmerkungen					
<b>8</b>	<b>DBU, Umweltschutz und Energie</b>		16.01.2023				
8.1	Belasteter Standort	Angetroffene Abfälle müssen umweltgerecht entsorgt werden. Der Beginn der Aushubarbeiten ist dem AUE frühzeitig zu melden	Ist im Projekt vorgesehen  Anzeige durch Bauleitung	BL		X	
8.2	Bodenschutz	Es ist sauber zu dokumentieren, welches Bodenmaterial vor Ort wiederverwertet und welches fachgerecht entsorgt wird		BBB		X	
8.3	Bodenschutz	Bodenkundliche Baubegleitung erforderlich	Ist so vorgesehen und im Mandat des PV enthalten				
8.4	Neophyten	Baumaschinen und Fahrzeuge vor Einsatz reinigen um Verschleppen von Neophyten zu verhindern	Aufnahme in Ausschreibung Sicherstellung auf Baustelle	BL UBB		X X	
8.5	Neophyten	Sicherstellung einer geeigneten Nachsorge für 3 Jahre nach Bauabschluss	Aufnahme in Vereinbarung mit Bewirtschaftern und in Unterhaltsplan	BHU PV		X X	
8.6	Lärmschutz	Keine wesentliche Änderung infolge des Projektes	Keine Massnahmen erforderlich				
8.7	Gewässerschutz	Bewilligung zur Eindolung Entwässerungsgraben kann in Aussicht gestellt werden					
8.8	Abwassereinleitung	Zuständigkeit für Bewilligung zur Einleitung von Strassenabwasser in Oberflächengewässer liegt bei der Gemeinde		Gde		X	
8.9	Naturschutz	Für allfällige Bepflanzungen oder Ansaaten sind standortgerechte und einheimische Pflanzen zu verwenden.	Wird in Projekt und Ausschreibung berücksichtigt	PV/BL		X	

Nr.	Gegenstand	Anträge / Forderungen	Beurteilung / Massnahme	Wer	BP	AP	Bemerkungen
8.10	Naturschutz	Die schützenswerte Waldgesellschaft angrenzend an den Strassenabschnitt bei Vorderschlatt darf durch die Bauarbeiten nicht tangiert bzw. beeinträchtigt werden	Wird in Ausschreibung berücksichtigt und während dem Bau von BL und UBB kontrolliert	PV/BL		X	
8.11	Naturschutz	Der ursprüngliche Zustand des TWW-Objektes Nr. 117 ist nach Abschluss der Bauarbeiten wiederherzustellen	Wird in Ausschreibung berücksichtigt und während dem Bau von BL und UBB kontrolliert	PV/BL		X	
8.12	Naturschutz	Der ursprüngliche Zustand der Biotopflächen ist wiederherzustellen. Wo dies nicht möglich ist, ist angemessener Ersatz zu schaffen	Wird in Ausschreibung berücksichtigt und während dem Bau von BL und UBB kontrolliert	PV/BL		X	
<b>9 DBU, Mobilität; öffentlicher Verkehr</b>			20.12.2022				
9.1	Buslinie	Zukünftige Streckenführung noch offen. Projekt erlaubt erforderliche Flexibilität.					
<b>10 DBU, Mobilität; Langsamverkehr</b>			04.12.2022				
10.1	Signalisation LV	Empfehlung: Signalisation 2.63.1 (gemeinsamer Rad- und Fussweg) durch 2.13 (Verbot für Motorwagen und Motorräder) ersetzen	In Projekt generell Signal 2.13 einsetzen	PV		X	
<b>11 DBU, Jagd und Fischerei</b>			23.11.2022				
11.1	Information	Bei unerwarteten Arbeiten an Linth, Bodenwald- oder Schlattbach AfF informieren und entsprechende Bewilligung beantragen	In weitere Projektbearbeitung beachten	GPL/PV		X	
11.2	Zaun	Verzicht im Bereich Wildtierkorridor	im Projekt berücksichtigt				
11.3	Wildwarnanlage	Erstellen Wildwarnanlage im Wildtierkorridor	im Projekt berücksichtigt Verzicht auf ergänzende Temporeduktion nach Rücksprache mit Polizei und Jagd und Fischerei Sicherstellung eines Monitorings mit der Option auf spätere Umsetzung ergänzender Massnahmen	PV		X	in Betriebsphase
11.4	Beleuchtung	Bei Querung Querspange auf sicherheitsbedingtes Minimum reduzieren	Nicht Gegenstand des Projektes >Berücksichtigung im Projekt Querspange	GPL			

Nr.	Gegenstand	Anträge / Forderungen	Beurteilung / Massnahme	Wer	BP	AP	Bemerkungen
<b>12</b>	<b>DBU, Raumentwicklung und Geoinformation</b>		08.02.2023				
12.1	Ausnahmebewilligungen	Folgende erforderliche Ausnahmebewilligungen können in Aussicht gestellt werden: - Bauvorhaben ausserhalb Bauzone - Unterschreitung Gewässerabstand - Unterschreitung Waldabstand					
12.2	Zonenplananpassung	Hinweis an Gemeinde, dass Zonenplan nach Projekt angepasst wird.		Gde			Nach Abschluss des Projektes
12.3	Fruchtfolgefleichen	Kompensation gemäss Rückmeldung Landwirtschaft erforderlich	Umsetzung im Projekt der Querspange (Renaturierung Pistenende) und des best. Rad- und Gehweges nach dessen Verlegung im vorliegenden Projekt	PV		X	
<b>13</b>	<b>DBU, Wasserbau</b>		18.11.2022				
13.1	Projektbeurteilung	Bestehende Abflusskapaziten werden beibehalten > Keine Einwände					
<b>14</b>	<b>DVI, Landwirtschaft</b>		11.01.2023				
14.1	Ertragsausfälle	Ertragsausfälle Landwirtschaft gemäss Richtzahlen Bauernverband entschädigen	Im Projekt analog Querspange vorgesehen	BHU		X	
14.2	Hochstammbäume	Ersatzpflanzungen für zu fällende Bäume vorsehen	Im Projekt aufgenommen				
14.3	Fruchtfolgefleichen	Kompensation zusammen mit Querspange (Pistenrenaturierung) Information Abt. Raumentwicklung zur Nachführung FFF in digitaler Form	Wird im Projekt Querspange umgesetzt  Erfolgt nach Fertigstellung des Projektes	BHU/PV		X	
14.4	Nachkartierung	Nachkartierung im zweiten Jahr nach Bauabschluss (zu Lasten Projekt) mit Information der Abt. Landwirtschaft (digital)		BHU/GPL		X	Koordination mit Projekt Querspange
