kanton glarus

Bau und Umwelt
Tiefbau

Bau und Umwelt
Tiefbau
Kirchstrasse 2
8750 Glarus
tiefbau@gl.ch

Projekt: Netstalerstrasse, Mollis
Objektbezeichnung: Strassenprojekt

Gemeinden: Glarus und Glarus Nord

Plan, Massstab: Bauphasen
Übersicht 1 : 7'500

Plan - Nr.: 1240.01-04.290

Beilage Nr.:

Genehmigungsvermerke:

Projektverfasser:

INGE Marty / Geoinfra

Marty Ingenieure AG
Ziegelbrückstrasse 58
8866 Ziegelbrücke

Geoinfra AG
Wägitalstrasse 24
8854 Siebnen

MARTY INGENIEURE AG

GEOINFRA INGENIEURE · GEOMETER · PLANER

Planauflage	Anmerkungen:	Entw.	Ges.	Gep.	Datum
Submissionsprojekt		-	sm, fb	PE	12.04.23
Ausführungsprojekt					
Unterlagen für die Ausführung					
Plan des ausgeführten Bauwerkes		Format:	74 x 152	Druckdatum:	12.04.23

Bauphase 1

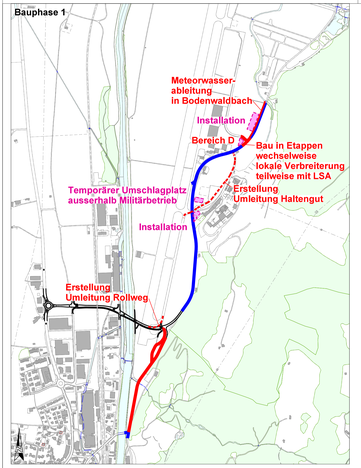

- Installation
- Abschnitt Flugplatz Bereich D, inkl. Meteorwasserableitung in Bodenwaldbach (mehrheitlich ausserhalb bestehender Strasse) und Abschnitt Schlatt
- mit lokaler Verbreiterung und LSA
- Erstellung Umleitung Haltengut und Rollweg

Bauphase 2

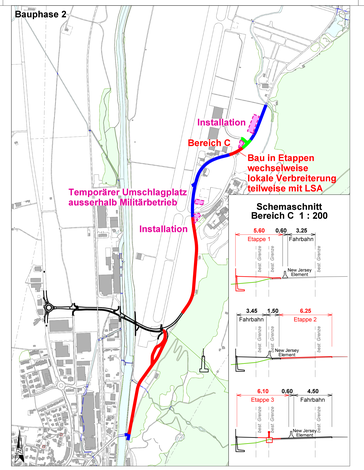

- Abschnitt Flugplatz Bereich C, Abschnitt Haltengut und Abschnitt Schlatt
- mit lokaler Verbreiterung und teilweise mit LSA
- Umleitung über Rollweg (vorhandene Belagsbreite 10 m)
- mögliche Umleitung über Haltengut

Bauphase 3

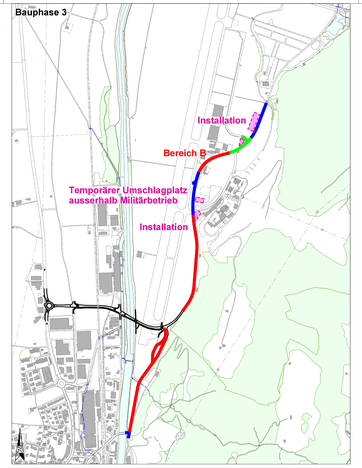

- Abschnitt Flugplatz Bereich B, Abschnitt Haltengut und Abschnitt Schlatt
- Umleitung über Rollweg (vorhandene Belagsbreite 10 m)
- Umleitung über Haltengut

Bauphase 4

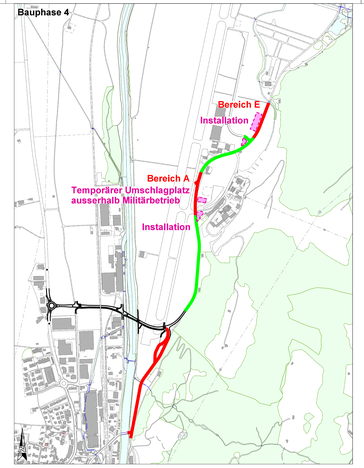

- Abschnitt Flugplatz Bereich A und E, Abschnitt Schlatt mit Brücke Netstal
- Umleitung über Haltengut
- Einspurig mit LSA

Abschlussarbeiten

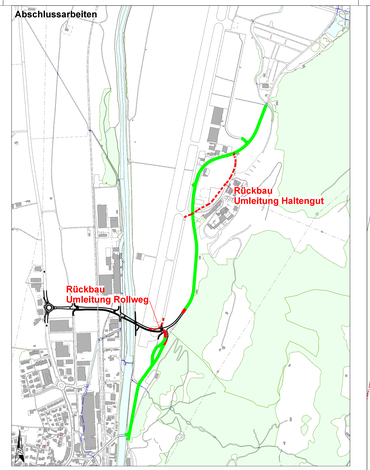

- Rückbau Umleitung Haltengut und Rollweg
- Anpassungsarbeiten Bereich Querspange
- Abschlussarbeiten
- Deckbelagsarbeiten (in Nachtetappen)

Provisorische Verkehrsführung Haltengut 1 : 1'000

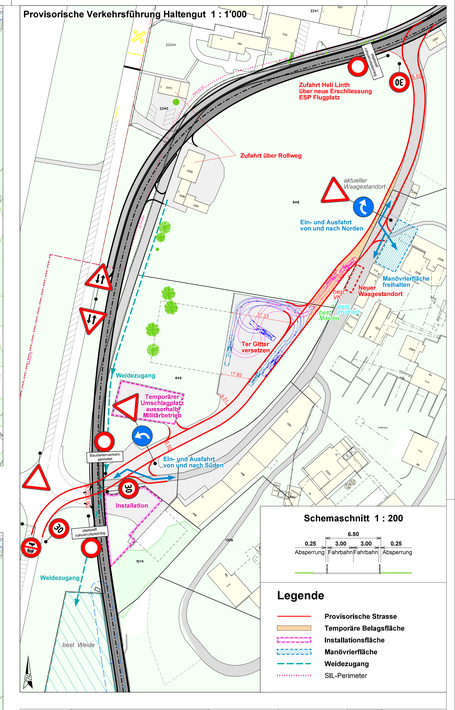

Detail Rollweg / Querspange 1 : 500

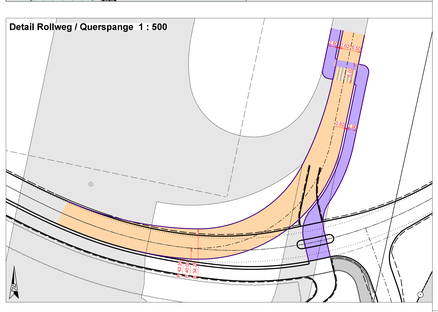

Verkehrsführung Langsamverkehr

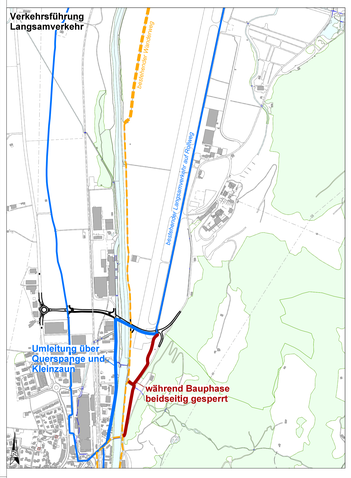

Verkehrsführung Bauphase 1

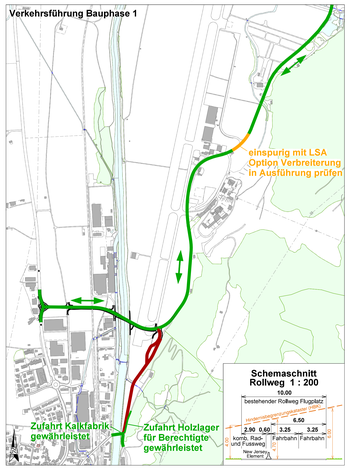

Verkehrsführung Bauphase 2

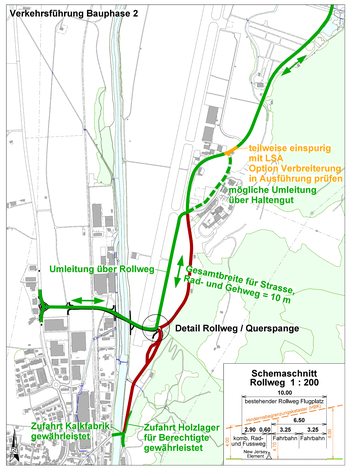

Verkehrsführung Bauphase 3

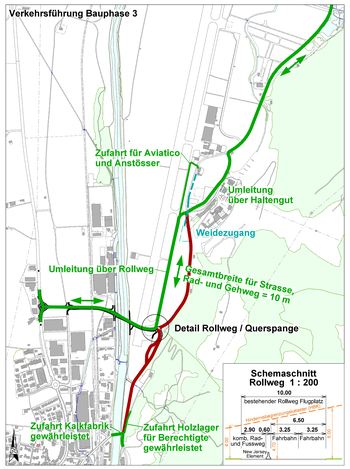

Verkehrsführung Bauphase 4

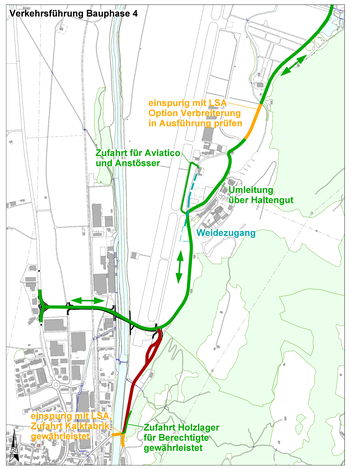

Verkehrsführung Abschlussarbeiten

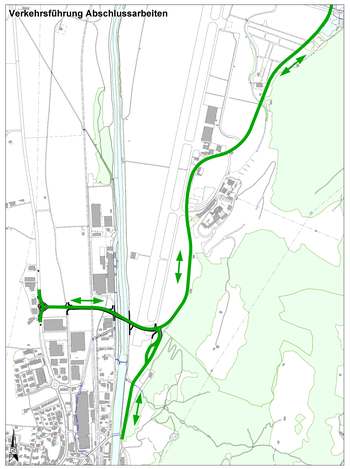

Legende

Bauphasen

- geplant
- im Bau
- realisiert

Verkehrsführung

- gesperrt
- einspurig mit LSA
- zweispurig
- *bestehender Wanderweg*
- *bestehender Langsamverkehr*

Bei Baubeginn ist die Querspange realisiert.

Terminprogramm Monat / Jahr	Feb '24	März '24	April '24	Mai '24	Juni '24	Juli '24	August '24	September '24	Oktober '24	November '24	Dezember '24	Januar '25	Februar '25	März '25	April '25	Mai '25
Terminprogramm Woche	8 9 10	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26 27	28 29 30 31 32	33 34 35 36	37 38 39 40	41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14	15 16 17 18 19	20 21 22
Installation																
Abschnitt Flugplatz																
Bereich A																
Bereich B																
Bereich C																
Bereich D + Meteorwasserableitung in Bodenwaldbach																
Bereich E																
Abschnitt Haltengut																
Abschnitt Schlatt																
Anpassungsarbeiten Bereich Brücke Netstal																
Anpassungsarbeiten Bereich Querspange																
Abschlussarbeiten																
Deckbelagsarbeiten (in Nachtetappen)																
Reserve																
Bauphasen		**Bauphase 1**				**Bauphase 2**			**Bauphase 3**				**Bauphase 4**		**Abschlussarbeiten**	
